

Rédacteur : **RENWICK Arnaud**

Direction : **DCA**

Objet : **Compte-rendu d'avancement hebdomadaire à date du 28 octobre**

Destinataire : **Ministère des Transports de Côte d'Ivoire**

Date d'édition : **10 décembre 2019**

Objet

Ce compte-rendu trace l'avancement du projet et des événements marquants de la semaine passée.

Résumé

Après la pause de collecte et de mapping lors du salon State of the Map Africa, le travail a repris au ralenti. Plusieurs causes à cela :


- Maladie d'un des retranscripteurs, qui a eu une poussée de malaria
- Attente de données sur les lignes Gbakas

Cette situation nous paraît risquée : la collecte doit se poursuivre pour permettre de rentrer dans les délais du projet

Actions de remédiation :

- Collecter les lignes Gbakas connues des collecteurs, sans attendre de liste de données
- Continuer la saisie des données dès qu'une ligne est collectée

Progression de la collecte et du mapping

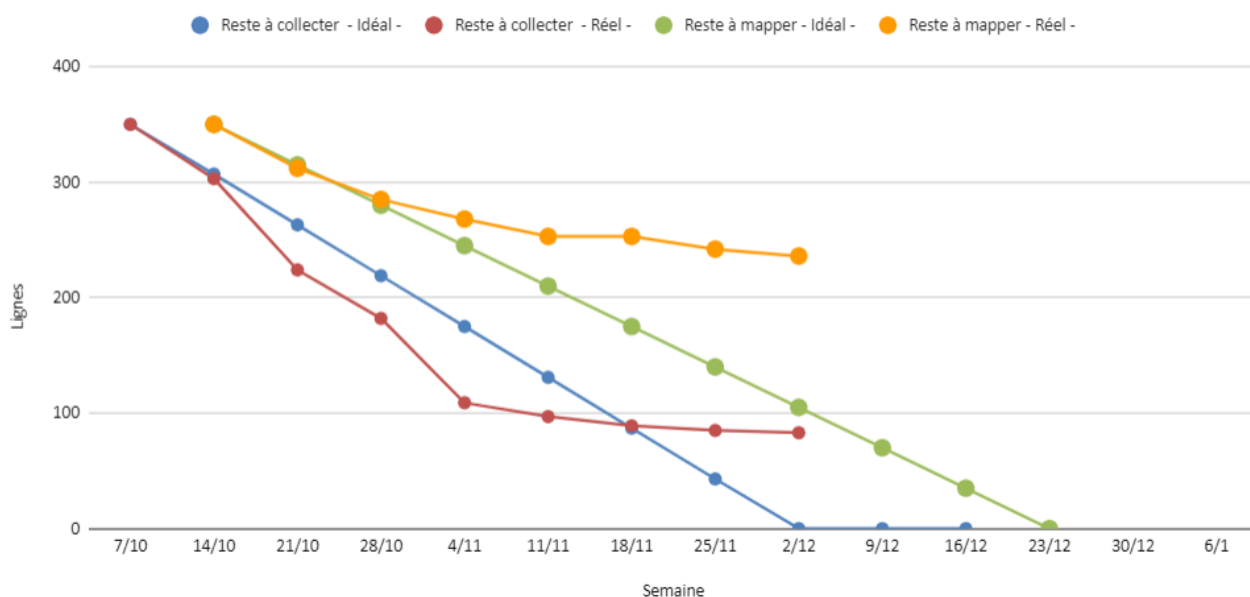

Nous mettons en place un suivi quotidien avec OSM-Ci pour redresser la barre et accélérer la collecte cette semaine.

Nous travaillons par ailleurs activement sur les scripts de génération de GTFS. Nous visons la fin du travail sur ces scripts courant décembre pour un premier GTFS valide début janvier.

Collecte des lignes

La collecte des lignes SOTRA est presque terminée, avec 111 lignes.
27 lignes Gbakas ont été relevées. La collecte va se poursuivre en se concentrant sur les lignes Gbakas.
18 lignes woro-woro ont été relevées.

Incidents

Pas d'incident récent.

Mapping des lignes

114 lignes ont été mappées depuis le début du projet.
Le mapping est aujourd'hui ralenti par la disponibilité des informations.

Des corrections sont également en train d'être mises en place pour améliorer l'export GTFS : normalisation du tag operator et du tag operator:website ainsi que des tag ref pour les variantes d'une même ligne.

Collecte des données annexes

Les données de la SOTRA n'ont toujours pas été transmises. Nous relançons pour demander leur envoi.
Les données de listes de lignes Gbaka n'ont pas été transmises, nous avançons sans elles.

Création des outils

Nous sommes en cours de travail sur le projet osm2gtfs et comptons faire les premières sorties de GTFS dans la seconde quinzaine de décembre, pour ajuster les données et les scripts en vue d'avoir un GTFS propre à début janvier.

Préparation du GTFS

Nous commençons à générer des premières versions du GTFS pour tester et adapter nos scripts. Nous ne passons pas pour le moment les tests du transitFeedValidator. Nous visons la fin de l'adaptation des scripts courant décembre pour avoir un GTFS propre début janvier, qui sera complété avec les données terrain qui continueront à être saisies.
