

Rédacteur : **RENWICK Arnaud**

Direction : **DCA**

Objet : **Compte-rendu d'avancement hebdomadaire à date du 28 octobre**

Destinataire : **Ministère des Transports de Côte d'Ivoire**

Date d'édition : **5 novembre 2019**

Objet

Ce compte-rendu trace l'avancement du projet et des évènements marquants de la semaine passée.


Résumé

La collecte des données GPS a continué à bon rythme, et concentré sur le réseau SOTRA. Nous avons eu cependant des blocages sur le réseau SOTRA. La plupart ont pu être résolus après avertissement des responsables de la SOTRA, mais cela nous ralentit dans la collecte.

Le mapping a également commencé, avec de bons retours du côté de la validation des données

Nous sommes en avance sur la collecte et prévoyons de ralentir le rythme sur les semaines qui viennent pour se rapprocher de la vitesse idéale.

Progression de la collecte et du mapping

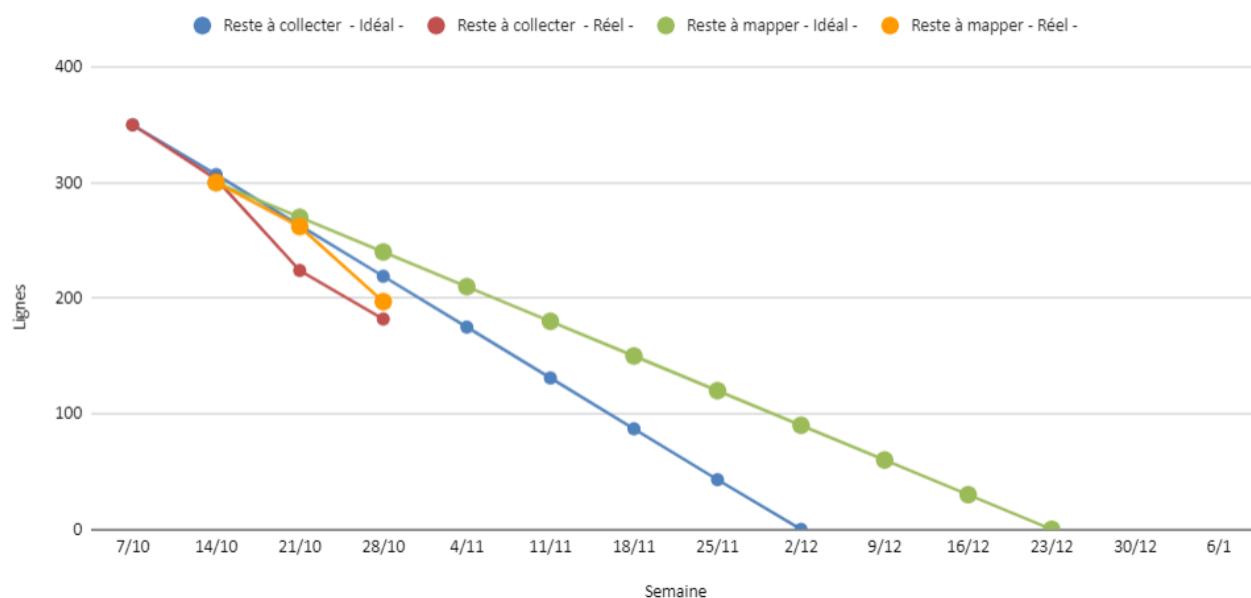

Collecte des lignes

La collecte des lignes a continué sur les lignes SOTRA, avec 42 Allers-retours supplémentaires. La collecte a encore de l'avance et on vise un rattrapage au rythme initialement prévu à la mi-novembre, à condition de ne pas rencontrer trop d'incidents.

La collecte des lignes SOTRA touche à sa fin : pour terminer la plupart des lignes, il nous manque simplement une collecte en heure de pointe, qui sera étalé sur la suite du temps de collecte. Une incertitude persiste : la liste de lignes n'ayant pas été fournie, nous ne sommes pas certains de l'exhaustivité de la collecte. Notre liste de ligne est réalisée empiriquement, par observation de l'offre disponible dans les gares. Il n'est pas impossible que des lignes périphériques, ne desservant pas les gares principales, nous aient échappé.

Par ailleurs on a remarqué l'existence de variantes de lignes SOTRA: par exemple les lignes express, qui desservent une petite partie des arrêts et circulent essentiellement en heure de pointe. Pour le moment on a fait le choix de bien les relever, pour les identifier séparément. On pense que c'est important parce que ce sont des services différents des lignes omnibus : elles ne desservent pas tous les arrêts, et n'ont pas les mêmes tracés. Cependant, ce sont des allers-retours supplémentaires pour les collecteurs et des mappages supplémentaires dans OpenStreetMap, ce qui consomme du budget. Nous échangeons pour savoir si cette approche est validée par le client.

Nous allons commencer bientôt la collecte sur les lignes Gbakas.

La liste des lignes dont la collecte est terminée est la suivante :

Numéro	Origine	Destination	Operateur	Réseau	Mode
02	Gare Marcory	Cite Fairmont	SOTRA	monbus	bus
03	Gare Nord	Marcory Anoumabo Aliodan	SOTRA	monbus	bus
04	Gare Marcory	Attécoubé	SOTRA	monbus	bus
05	Koumassi-Nord-Est	Cité Administrative	SOTRA	monbus	bus
07	Gare Marcory	Terminus Cité Vridi	SOTRA	monbus	bus
08	Abobo Akeikoi Village	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
10	Gare Sud	Gare nord	SOTRA	monbus	bus
11	liberte Adjame	Koumassi Mesano	SOTRA	monbus	bus
13	Gare Nord	Gare Koumassi	SOTRA	monbus	bus
14	Gare Marcory	Gare Williamsville	SOTRA	monbus	bus
16	Abobo Biabou	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
20	Gare Sud	Dépôt Yopougon	SOTRA	monbus	bus
22	Entente Treichville	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
24	cpma Vridi	Lycée municipal de Koumassi	SOTRA	monbus	bus
27	Gare Sud	Gare Sud Niangon Sud à gauche	SOTRA	monbus	bus
28	Gare Sud	Riviera 2	SOTRA	monbus	bus
30	Gare Sud	Yopougon Kouté	SOTRA	monbus	bus
31	Marcory Aliodan	Commissariat Port	SOTRA	monbus	bus
35	Cocody Gobelet	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
37	Gare Sud	Yopougon Camp Militaire	SOTRA	monbus	bus

39	Gare Sud	Niangon Sud à droite	SOTRA	monbus	bus
40	Yopougon Kouté	Gare Sud	SOTRA	monbus	bus
41	liberte Adjame	M'pouto	SOTRA	monbus	bus
42	Abobo Doumé	Yopougon Sideci	SOTRA	monbus	bus
43	Yopougon Kouté	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
47	Abobo Doumé	yopougon Attié	SOTRA	monbus	bus
48	St Jean	Abobo Gendarmerie	SOTRA	monbus / Navette	bus
49	Abobo Sogefiha	Campus Cocody	SOTRA	monbus	bus
53	Terminus Cité Vridi	Gare Campus	SOTRA	monbus	bus
53	Campus	Gonzagueville	SOTRA	monbus	bus
54	Gendarmerie Abobo	Cité Administrative	SOTRA	monbus	bus
58	Adjamé Liberté	Port de peche	SOTRA	monbus	bus
60	Mairie d'Abobo	Mairie d'Anyama	SOTRA	monbus	bus
64	Gare Nord	Blockauss	SOTRA	monbus	bus
67	Marché de Treichville	Anani	SOTRA	monbus	bus
68	Anani	Gare Koumassi	SOTRA	monbus	bus
75	Abobo Baoulé	Cité Administrative	SOTRA	monbus	bus
76	PK 18 (Abobo)	Cité Administrative	SOTRA	monbus	bus
77	Abobo Gendarmerie	Micao Youpougon	SOTRA	monbus	bus
78	M'badon	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
79	Adjamé Liberté	Gendarmerie Abobo	SOTRA	monbus / Navette	bus
80	Chu d'Angré	Abobo Biabou	SOTRA	Navette	bus
81	Gare Nord	Angré	SOTRA	monbus	bus
82	Gare Sud	Angré	SOTRA	monbus	bus
83	Gare Nord	Ecole de Police	SOTRA	monbus	bus
84	Gare Nord	Blockauss	SOTRA	monbus	bus
85	Yopougon Kouté	Campus Cocody	SOTRA	monbus	bus
85	Yopougon Phalène	Campus Cocody	SOTRA	monbus	bus
87	La Vie	Bingerville	SOTRA	monbus	bus
90	Blockauss	Angré	SOTRA	monbus	bus
91	Liberté Adjame	Gare sud	SOTRA	monbus	bus
92	Gare Koumassi	Gare Nord	SOTRA	monbus	bus
94	Blockauss	Gare Marcory	SOTRA	Wibus	bus
611	Gendarmerie Abobo	Chu Angré	SOTRA	monbus / Navette	bus
206	Hôtel de ville	Yopougon Kouté	SOTRA	Express	bus
209	Gare Sud	Gandhi	SOTRA	Express	bus
212	Niangon Sud à droite	Gare Sud	SOTRA	Express	bus
702	Cité Eden	La Vie	SOTRA	Wibus	bus
704	Chateau d'eau d'Angré	Saint Jean	SOTRA	Wibus	bus
704	Abobo Baoulé	Saint Jean	SOTRA	Wibus	bus
704	Dokoui	Saint Jean	SOTRA	Wibus	bus
710	Abatta Village	La Vie	SOTRA	Wibus	bus
712	Yopougon Lavage Saint André	Grand carrefour Koumassi	SOTRA	monbus / Navette	bus
712	Amondji	Grand carrefour Koumassi		monbus / Navette	bus
715	Grand carrefour Koumassi	Sococe Deux plateaux	SOTRA	monbus	bus
719	Yopougon Lavage Saint André	Angré Terminus 81-82	SOTRA	monbus / Navette	bus

720	Yopougon Lavage Saint André	Rond-point Palmeraie	SOTRA	monbus / Navette	bus
727	Yopougon Lavage Saint André	Cocody Saint Jean	SOTRA	monbus / Navette	bus
1	Riviera 2	Angré Terminus 81-82	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
2	Riviera 2	Angré 22ème	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
3	Riviera 2	Attoban Camp	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
5	Zoo	Vallon	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
6	Zoo	Attoban	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
7	Zoo	Aghien	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
8	Cocody gare	Mobile Azur	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
9	Mobile Azur	Angré Château	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
13	Carrefour 9km	Palmeraie Spim 4	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
14	Palmeraie	Les Rosiers	divers	Woro-woro de Cocody	woro woro
1	Adjamé Liberté	Adjamé Williamsville Macaci	divers	Woro-woro d'Adjamé	woro woro
2	Adjamé Liberté	Adjamé Saint Michel	divers	Woro-woro d'Adjamé	woro woro
3	Adjamé Liberté	Adjamé Mairie Dallas	divers	Woro-woro d'Adjamé	woro woro
1	Treichville Gare de Bassam	Treichville Gare Bateau-bus	divers	Woro-woro de Treichville	woro woro

Incidents

Cette semaine, quatre incidents sont à déplorer.

Date	Heure	gare/Ligne	Collecteur	Incident	Mesures prises
2019-10-29	13h30-14H	613		Un refus de donner une place assise au collecteur	
2019-10-29		Grand Carrefour Koumassi		Le collecteur a demandé une place assise dans le bus. Le machiniste lui a refusé.	Rappel aux collecteurs du fait qu'il n'y a pas de place assise réservée pour l'enquête
2019-10-29		Depôt sud SOTRA		Le chef des contrôleurs du dépôt a refusé que le collecteur monte dans le bus, indiquant qu'il n'était pas informé et que le document n'est pas valable	Rappel dans le mail de plan de collecte

2019-10-30		206 express		Le machiniste refuse la montée du collecteur, et refuse de lire le passe et le courrier de la SOTRA	L'enquêteur a pris le bus suivant. Rappel dans le mail de plan de collecte
------------	--	-------------	--	---	--

Ces incidents sont importants et devraient être traités avec attention :

- Les incidents sur les places assises peuvent avoir des impacts sur la sécurité des personnes, en déclenchant des accidents.
- Les incidents sur l'autorisation à embarquer dans le bus peuvent ralentir ou stopper la collecte s'ils se systématisent

Le ministère a été très réactif dès qu'il a appris les incidents et se coordonne avec la direction de la SOTRA.

Mapping des lignes

27 lignes ont été mappées. Le timing d'entrée dans OSM est respecté

Collecte des données annexes

Les données de la SOTRA n'ont toujours pas été transmises. Nous avons relancé par de nombreux mails et appels téléphoniques. Nous relançons pour demander leur envoi, et prévoyons de demander un support de l'AFD si cette demande n'aboutit pas.

Création des outils

Rien à signaler cette semaine

Préparation du GTFS

Rien à signaler cette semaine.
